

# 經濟部公共工程基本設計審查機制第參點修正對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>參、審查作業機制</p> <p>一、本部公共工程計畫中總工程建造經費達一定金額以上之個案工程，由本部專案辦理審查會議審查，會議主持人由本部指派技監或參事層級以上高階主管擔任。</p> <p>(一)所稱一定金額以上個案工程之規模，依工程計畫主辦機關之屬性區分如次：</p> <p>1、工程專責單位(水利署)：總工程建造經費在新臺幣四億元以上之工程。(不含補助型工程)</p> <p>2、非工程專責單位：總工程建造經費在新臺幣一億元以上之工程。</p> <p>(二)審查會議屬專業技術審查，除由本部指派專人擔任審查委員外，必要時可聘請相關專家、學者若干名協助辦理審查，以達到客觀獨立之審查功能。</p> <p>(三)審查過程得視實際需要辦理現場現勘，並拍照記錄存證。</p> <p>(四)審查會議除本部主辦機關相關人員及專家委員參與外，另應邀請行政院及本部相關審議或管考機關派員列席。</p> <p>(五)基本設計階段審查提送參考內容，說明如</p>	<p>參、審查作業機制</p> <p>一、本部公共工程計畫中總工程建造經費達一定金額以上之個案工程，由本部專案辦理審查會議審查，會議主持人由本部指派技監或參事層級以上高階主管擔任。</p> <p>(一)所稱一定金額以上個案工程之規模，依工程計畫主辦機關之屬性區分如次：</p> <p>1、工程專責單位(水利署)：總工程建造經費在新臺幣四億元以上之工程。(不含補助型工程)</p> <p>2、非工程專責單位：總工程建造經費在新臺幣一億元以上之工程。</p> <p>(二)審查會議屬專業技術審查，除由本部指派專人擔任審查委員外，必要時可聘請相關專家、學者若干名協助辦理審查，以達到客觀獨立之審查功能。</p> <p>(三)審查過程得視實際需要辦理現場現勘，並拍照記錄存證。</p> <p>(四)審查會議除本部主辦機關相關人員及專家委員參與外，另應邀請行政院及本部相關審議或管考機關派員列席。</p> <p>(五)基本設計階段審查提送參考內容，說明如</p>	<p>一、第一款修正，說明如下：</p> <p>(一)第五目修正：</p> <p>1、第五目之13修正。鑑於再生能源發電方式多元化，將「再生能源發電設備」修正為「再生能源發展」。</p> <p>2、增訂第五目之16。依據行政院公共工程委員會一百十一年八月三十一日函頒之公共工程節能減碳檢核注意事項，新增「節能減碳檢核作業」。</p> <p>(二)第七目修正。第七目之4所定「再生能源發電設備」修正為「再生能源發展」，理由同第五目修正說明1。</p> <p>(三)第九目修正。配合經濟部組織改造，修正秘書作業單位之簡稱。</p> <p>(四)第一目至第四目、第六目及第八目未修正。</p> <p>二、第二款修正。依行政院公共工程會一百零六年九月四日工程技字第一〇六〇〇二五九八六〇號函說明，</p>

<p>下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、研究報告審查意見說明。</li> <li>2、基地及周圍環境分析（補充測量及地質調查及其他補充調查、試驗或勘測報告）。</li> <li>3、需求計畫（包含空間或使用壽年）。</li> <li>4、規劃理念說明書（概要描述）。</li> <li>5、法令分析。</li> <li>6、初步配置圖（包含初步平面圖、初步立面圖、初步剖面圖及結構系統規劃）。</li> <li>7、機電設備系統規劃書。</li> <li>8、建造成本經費預估（含計算書）、經費籌措及分配年度（應考慮物價可能波動之風險）。</li> <li>9、施工初步時程。</li> <li>10、設計準則與綱要規範。</li> <li>11、採購策略。</li> <li>12、取得用地證明。</li> <li>13、再生能源發展或綠色內涵之設計規劃。</li> <li>14、替選方案評估。</li> <li>15、生態檢核作業。</li> <li>16、<u>節能減碳檢核作業</u>。</li> </ol> <p>（六）為加速審查程序，工程主辦單位送審時應檢附基本設計階段審查提送文件自主檢核表（如附件一），書件不齊且未有適當理由者，經通知後未於三日內補正者，得逕退</p>	<p>下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、研究報告審查意見說明。</li> <li>2、基地及周圍環境分析（補充測量及地質調查及其他補充調查、試驗或勘測報告）。</li> <li>3、需求計畫（包含空間或使用壽年）。</li> <li>4、規劃理念說明書（概要描述）。</li> <li>5、法令分析。</li> <li>6、初步配置圖（包含初步平面圖、初步立面圖、初步剖面圖及結構系統規劃）。</li> <li>7、機電設備系統規劃書。</li> <li>8、建造成本經費預估（含計算書）、經費籌措及分配年度（應考慮物價可能波動之風險）。</li> <li>9、施工初步時程。</li> <li>10、設計準則與綱要規範。</li> <li>11、採購策略。</li> <li>12、取得用地證明。</li> <li>13、再生能源發電設備或綠色內涵之設計規劃。</li> <li>14、替選方案評估。</li> <li>15、生態檢核作業。</li> </ol> <p>（六）為加速審查程序，工程主辦單位送審時應檢附基本設計階段審查提送文件自主檢核表（如附件一），書件不齊且未有適當理由者，經通知後未於三日內補正者，得逕退請工程主辦單位補件。</p> <p>（七）審查原則：</p>	<p>「投資型工程」依政府公共工程計畫與經費審議作業要點第六點規定，比照國營事業個案工程辦理審議，爰本作業機制於一百零六年修正時已將第貳點「適用範圍」、第參點「審查作業機制」四(二)刪除「投資型」工程，為使相關規定一致，爰予修正刪除「投資型工程」，並酌作文字修正。</p> <p>三、第三款至第六款未修正。</p>
--	---	---

<p>請工程主辦單位補件。</p> <p>(七)審查原則：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、可行性評估階段核定內容與匡列經費進入基本設計階段辦理技術專業審查及經費概算之作業管控之落實度。</li> <li>2、相關工期、經費概算之精確度與可靠度。</li> <li>3、施工階段承攬契約相關發包文件應注意事項。</li> <li>4、為落實永續經營、節能減碳、維護生態環境之政策目標，如有相關再生能源發展、綠色內涵指標及經費比例一併列入審查。</li> </ol> <p>(八)審查流程：經濟部公共工程計畫基本設計審查作業流程圖（如附件二）。</p> <p>(九)審查會議之秘書作業由本部國營事業管理司主辦、申請審查之計畫主辦單位協辦（準備審查資料及其他行政支援作業），有關外聘委員之出席費、審查費、差旅費等，由計畫主辦機關相關費用項下支應。</p> <p>二、未達一定金額以上之所屬工程，或工程專責單位所屬補助型工程之基本設計審查，由各計畫主辦機關負責審查，審查原則準用本機制之規定，其審查機制由計畫主辦機關訂定後報部備查。</p> <p>三、新臺幣四億元以上之個</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、可行性評估階段核定內容與匡列經費進入基本設計階段辦理技術專業審查及經費概算之作業管控之落實度。</li> <li>2、相關工期、經費概算之精確度與可靠度。</li> <li>3、施工階段承攬契約相關發包文件應注意事項。</li> <li>4、落實永續經營、節能減碳、維護生態環境之政策目標，如有相關再生能源發電設備、綠色內涵指標及經費比例一併列入審查。</li> </ol> <p>(八)審查流程：經濟部公共工程計畫基本設計審查作業流程圖（如附件二）。</p> <p>(九)審查會議之秘書作業由本部國營會主辦、申請審查之計畫主辦單位協辦（準備審查資料及其他行政支援作業），有關外聘委員之出席費、審查費、差旅費等，由計畫主辦機關相關費用項下支應。</p> <p>二、未達一定金額以上之所屬工程及工程專責單位所屬補助型或投資型工程之基本設計審查，由各計畫主辦機關負責審查，審查原則準用本機制之規定，其審查機制由計畫主辦機關訂定後報部備查。</p> <p>三、新臺幣四億元以上之個案工程經審查同意後，由各計畫主辦機關備妥</p>	
--	--	--

<p>案工程經審查同意後，由各計畫主辦機關備妥相關文件送審查單位辦理部稿轉送行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)辦理基本設計審議。</p> <p>四、未達新臺幣四億元之個案工程(不含總工程建造經費未達新臺幣一億元公共工程及房屋建築計畫)經審查通過後由審查單位辦理部稿以正本函送主辦機關，並副知行政院、行政院主計總處、工程會等審議機關及本部管考會計等相關單位，前述審查單位區分如次：</p> <p>(一)本部：非工程專責單位所屬總工程建造經費在新臺幣一億元以上未達新臺幣四億元之個案工程(包含補助型)。</p> <p>(二)工程專責單位(水利署)：所屬總工程建造經費未達新臺幣四億元及補助型之個案工程。</p> <p>(三)非工程專責單位：所屬總工程建造經費未達新臺幣一億元之個案工程(包含補助型)。</p> <p>五、總工程建造經費在新臺幣一億元以上個案工程之各項審查成效(包含審議期程、審議前後工期及經費之差異等)請各計畫主辦機關定期提送本部，俾利檢討管控及配合工程會指示彙送檢討。</p>	<p>相關文件送審查單位辦理部稿轉送行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)辦理基本設計審議。</p> <p>四、未達新臺幣四億元之個案工程(不含總工程建造經費未達新臺幣一億元公共工程及房屋建築計畫)經審查通過後由審查單位辦理部稿以正本函送主辦機關，並副知行政院、行政院主計總處、工程會等審議機關及本部管考會計等相關單位，前述審查單位區分如次：</p> <p>(一)本部：非工程專責單位所屬總工程建造經費在新臺幣一億元以上未達新臺幣四億元之個案工程(包含補助型)。</p> <p>(二)工程專責單位(水利署)：所屬總工程建造經費未達新臺幣四億元及補助型之個案工程。</p> <p>(三)非工程專責單位：所屬總工程建造經費未達新臺幣一億元之個案工程(包含補助型)。</p> <p>五、總工程建造經費在新臺幣一億元以上個案工程之各項審查成效(包含審議期程、審議前後工期及經費之差異等)請各計畫主辦機關定期提送本部，俾利檢討管控及配合工程會指示彙送檢討。</p> <p>六、本機制規定未盡事項，依行政院核定之審議效</p>	
---	---	--

六、本機制規定未盡事項，依行政院核定之審議效率方案及審議要點辦理。	率方案及審議要點辦理。	
-----------------------------------	-------------	--

# 第參點附件一(修正後)

附件一

## 基本設計階段審查提送文件自主檢核表

編號	章節名稱	是	否	備註(文件未檢附理由)
(1)	研究報告審查意見說明			
(2)	基地及周圍環境分析(補充測量及地質調查及其他補充調查、試驗或勘測報告)			
(3)	需求計畫(包含空間或使用壽年)			
(4)	規劃理念說明書(概要描述)			
(5)	法令分析			
(6)	初步配置圖(包含初步平面圖、初步立面圖、初步剖面圖及結構系統規劃)			
(7)	機電設備系統規劃書			
(8)	建造成本經費預估(含計算書)、經費籌措及分配年度(應考慮物價可能波動之風險)			
(9)	施工初步時程			
(10)	設計準則與綱要規範			
(11)	採購策略			
(12)	取得用地證明			
(13)	再生能源發展或綠色內涵之設計規劃			
(14)	替選方案評估			
(15)	生態檢核作業			
(16)	節能減碳檢核作業			

- 註： 1. 個案工程採統包方式辦理，且統包範圍含基本設計者，其圖說文件得僅包括功能需求、功能規劃、設施等級、工程規模、經費概算等類別文件。
2. 項次編號(14)替選方案評估，請依行政院工程會「政府公共工程計畫與經費審議作業要點-基本設計階段之必要圖說」相關規定辦理。
3. 項次編號(15)公共工程生態檢核作業，請依行政院「公共工程生態檢核機制」有關工程計畫核定、規劃等階段之規定辦理，並檢附相關檢核自評表。
4. 項次編號(16)節能減碳檢核作業，請依行政院公共工程委員會「公共工程節能減碳檢核注意事項」辦理，並檢附公共工程節能減碳檢核表。

修正說明：配合第參點第五目之16規定「節能減碳檢核作業」納入基本設計階段審查之提送參考內容，爰修正本檢核表納入該項目，並增訂備註第四點；另配合同點第七目修正規定，爰修正本檢核表項次編號(13)之章節名稱。

# 第參點附件一(修正前)


## 附件一 基本設計階段審查提送文件自主檢核表

編號	章節名稱	是	否	備註(文件未檢附理由)
(1)	研究報告審查意見說明			
(2)	基地及周圍環境分析(補充測量及地質調查及其他補充調查、試驗或勘測報告)			
(3)	需求計畫(包含空間或使用壽年)			
(4)	規劃理念說明書(概要描述)			
(5)	法令分析			
(6)	初步配置圖(包含初步平面圖、初步立面圖、初步剖面圖及結構系統規劃)			
(7)	機電設備系統規劃書			
(8)	建造成本經費預估(含計算書)、經費籌措及分配年度(應考慮物價可能波動之風險)			
(9)	施工初步時程			
(10)	設計準則與綱要規範			
(11)	採購策略			
(12)	取得用地證明			
(13)	再生能源發電設備或綠色內涵之設計規劃			
(14)	替選方案評估			
(15)	生態檢核作業			

- 註： 1. 個案工程採統包方式辦理，且統包範圍含基本設計者，其圖說文件得僅包括功能需求、功能規劃、設施等級、工程規模、經費概算等類別文件。
2. 項次編號(14)替選方案評估，請依行政院工程會「政府公共工程計畫與經費審議作業要點-基本設計階段之必要圖說」相關規定辦理。
3. 項次編號(15) 公共工程生態檢核作業，請依行政院「公共工程生態檢核機制」有關工程計畫核定、規劃等階段之規定辦理，並檢附相關檢核自評表。

# 第參點附件二(修正後)

附件二 經濟部公共工程計畫基本設計審查作業流程圖

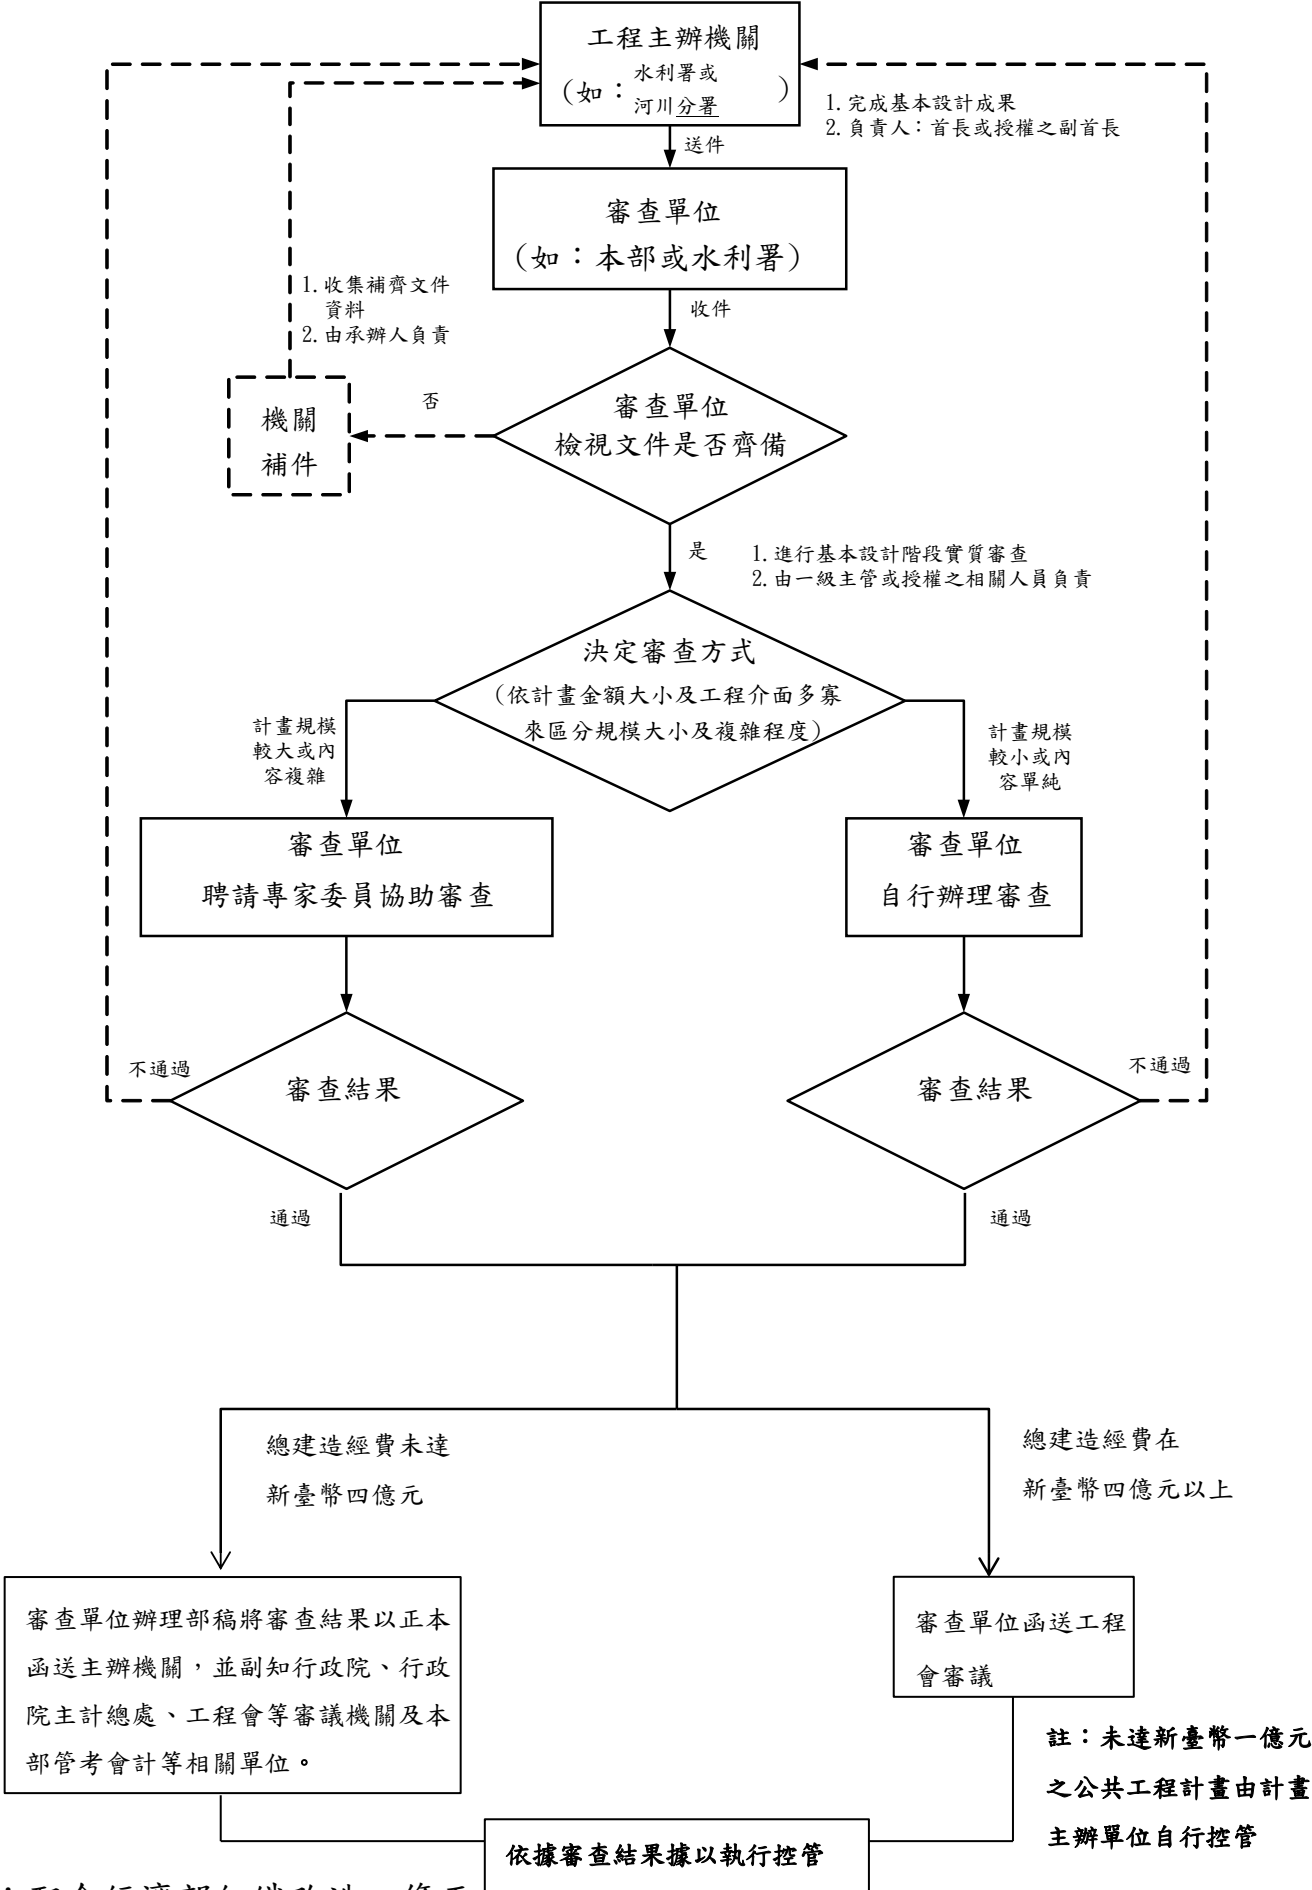

修正說明：配合經濟部組織改造，修正「工程主辦機關」名稱。



第參點附件二(修正前)

附件二 經濟部公共工程計畫基本設計審查作業流程圖

